UNACEM PERÚ – SUB COMITÉ TEA

EXAMEN DE SUPERVISOR TEA LIDER Vs02

Nivel de evaluación: personal competente que revisa y libera permisos TEA

Base técnica: DSHIU-S-002 Estándar de Trabajos en Altura v03 y Taller de Liberación de Permisos TEA.

Apellidos y nombres	_____	**Cargo**	_____
Empresa	_____	**Fecha**	_____
Evaluador competente	_____	**Puntaje / 20**	_____

Indicaciones de aplicación
• Tiempo sugerido: 30 minutos. Puntaje total: 20 puntos. Aprobación mínima: 14 puntos.
• Sección I: marque una sola alternativa por pregunta. Sección II: sustente técnicamente la decisión tomada.
• Permitir calculadora simple. Para equipos auto retráctiles, priorice siempre el manual del fabricante además de lo indicado en el estándar.
• Esta evaluación fue reforzada con preguntas situacionales y criterios de revisión propios de liberación de permisos TEA.

SECCIÓN I. PREGUNTAS CONCETUALES — 5 pts

1. **Según la resistencia mínima de cargas estáticas para anclajes ¿Cuántos son los tipos de aplicaciones de anclajes?**

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7

2. **¿Todas las aplicaciones de anclaje deben soportar 5000 lbf o 2268 Kgf?**

a) Verdadero
b) Falso

3. **Completa la definición de distancia total de caída (TFD)**

TFD=_____+_____

4. **Enliste ordenadamente las jerarquías de protección contra caídas**

I) _____
II) _____
III) _____
IV) _____
V) _____

5. **¿Cuál es la distancia de caída libre (Free Fall) máxima para un bloque retráctil clase 2? Marca la alternativa correcta**

a)0.61m b) 1.8 m. c) 2.6 m. d) 3 m. e) 3.6 m.

SECCIÓN II. CASOS APLICADOS DE LIBERACIÓN 15 ts

Un trabajador se ubica en la segunda plataforma de un andamio a **2.40 m** del suelo. Usará un tambor retráctil **DBI-SALA Nano-Lok 3M de 1.8m Clase 1**, tendrá un radio de trabajo de 1 m y se enganchará a la altura del anillo dorsal cuyo requerimiento de claridad se muestra en la siguiente gráfica:

6) **Identifique los requerimientos de claridad:**



7) **Bajo el mismo punto de anclaje y la misma altura de la plataforma, ¿Cuál es el radio máximo admisible (en metros) para garantizar que el requerimiento de claridad del equipo sea <= que el requerimiento de claridad de campo?**

_____

La plataforma de trabajo está a **4.20m**. Su empresa cuenta con bloques retráctiles **V-TEC PFL MSA de 1.8 m clase 1**. El supervisor ejecutante considera una altura de anclaje a 0.5m por encima de la altura del anillo dorsal y requiere determinar el radio máximo de trabajo admisible.

8) **¿Cuál es el radio máximo admisible para cumplir con el requerimiento de claridad del equipo que sea <= al requerimiento de claridad medido en campo?**

_____

9) **En función del radio máximo hallado Identifique los requerimientos de claridad:**



10) **El supervisor ejecutante le indica que sus trabajadores se anclarán a la altura del anillo dorsal. ¿Cuál es el radio de trabajo máximo para cumplir con una claridad suficiente?**

_____

La plataforma de andamio se encuentra a **3.70 m**, se cuenta con una línea retráctil **V-TEC EDGE PFL MSA de cable de 2.4 m clase 2**. El anclaje será a 0.5m por debajo de la altura del anillo dorsal y se ha considerado un desplazamiento horizontal de 1.5 m.

11) Bajo las condiciones indicadas, ¿cuál es la claridad del equipo?

_____
_____
_____
_____

12) ¿Qué ajuste al radio máximo de trabajo y a la altura de anclaje usted permitiría para cumplir con la claridad medida en campo de 3.7 m?

_____
_____
_____
_____

Un trabajador realizará un trabajo sobre una PEMP a 4.1 m de altura. Se le solicita evaluar el uso de un un tambor retráctil **3M protecta SRD de 10.1 m clase 1**, el trabajador se ancla a 0.50 m por debajo de la altura de la argolla dorsal y tiene planeado una translación horizontal máxima de 0.50 m.


13) ¿Permite el trabajo de altura? Justifique su respuesta:

_____
_____
_____
_____

14) ¿Qué modelos de bloque retráctil disponibles en la calculadora FallClear usted recomendaría usar para cumplir con las condiciones requeridas?

_____
_____
_____
_____

En un trabajo sobre andamios, la base regulable quedó a **60 cm del piso**. Se utilizará un bloque retráctil **V-SHOCK Edge doble PFL MSA Clase 2 con configuración doble brazo de 3m,** considerar anclaje a la altura del anillo dorsal y **un radio máximo de trabajo de 1 m**. El trabajador se posicionará en el 3er cuerpo de andamio (considerar cada cuerpo de 2 m de altura)

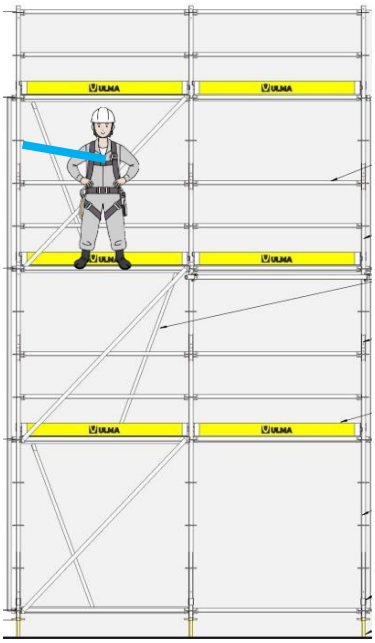

15) Identifique los requerimientos de claridad:




16) ¿Cuál es el radio máximo admisible para cumplir con el requerimiento de claridad del equipo que sea <= al requerimiento de claridad medido en campo?

_____

17) Para el radio máximo de trabajo inicial (1 m), ¿Cuál es la altura de anclaje mínima para cumplir un requerimiento de claridad de 4.3m?

_____

Un trabajador se encuentra en una plataforma de trabajo sin barandas. Para protección contra caídas, se ha instalado una línea de vida MSA anclada a dos estructuras separadas por 9 metros. La línea de vida está ubicada a 1.7 metros por encima de la plataforma. De acuerdo con el cuadro del manual de la **línea de vida MSA**, se solicita calcular la claridad del equipo. Solo un trabajador se conectará a la línea utilizando un **retráctil para borde cortante (SRL).** La plataforma de trabajo se encuentra a una **altura de 8 metros respecto al piso** del primer nivel.



1 USER		Span Length					
Max. 141 kg	Connected PPE	3.05 m	6.10 m	9.14 m	12.19 m	15.24 m	18.29 m
	MSA Leading Edge PFL	3.35	3.81	4.42	4.72	5.03	5.49
	MSA Leading Edge SRL	3.20	3.66	4.11	4.57	4.88	5.18
	MSA 6 ft. Energy-Absorbing Leading Edge Lanyard	4.42	4.88	5.33	5.79	6.25	6.71

2 USERS		Span Length					
Max. 281 kg	Connected PPE	3.05 m	6.10 m	9.14 m	12.19 m	15.24 m	18.29 m
	MSA Leading Edge PFL	3.81	4.27	4.72	5.18	5.49	5.79
	MSA Leading Edge SRL	3.66	4.11	4.57	5.03	5.33	5.64
	MSA 6 ft. Energy-Absorbing Leading Edge Lanyard	5.03	5.49	5.94	6.40	6.86	7.32

18) Identifique los requerimientos de claridad:

DISTANCIA DE CLARIDAD REQUERIDO (CALCULADO) DEBE SER MENOR O IGUAL A LA DISTANCIA DE CLARIDAD MEDIDO EN CAMPO

1 Requerimiento de Claridad Calculado (C.a. Requerido Calculado) _____ <= _____ Requerimiento de Claridad de Campo (C.a.Medido en campo) 2

19) ¿Qué medidas tomarías para garantizar la seguridad si se conectan 2 trabajadores a la LVH instalada?


_____


_____

_____

_____

Durante el mantenimiento preventivo de una torre grúa, un trabajador realiza labores sobre la pluma utilizando una **línea de vida horizontal MSA instalada a 0,90 m** sobre la plataforma de trabajo a una altura de **27 m sobre el suelo**.

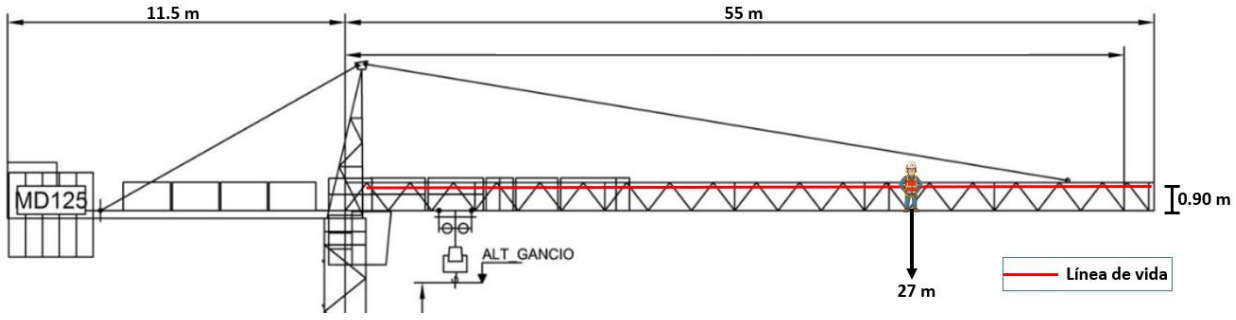



20) ¿Cuál es la selección de equipo más adecuada y por qué?

a) Bloque retráctil Clase 1
b) Bloque retráctil Clase 2
c) Línea de anclaje doble etiqueta blanca
d) Línea de anclaje doble etiqueta negra
e) La B y D son correctas

Justifique su respuesta:

_____
_____
_____
_____
